



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Piazza della Vittoria, 47 - 56020 Santa Maria a Monte (PI)

Tel: 0587 261611 - Fax: 0587 705117


PEC: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it

PROGETTO:

ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTECALVOLI

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitivo ed Esecutivo

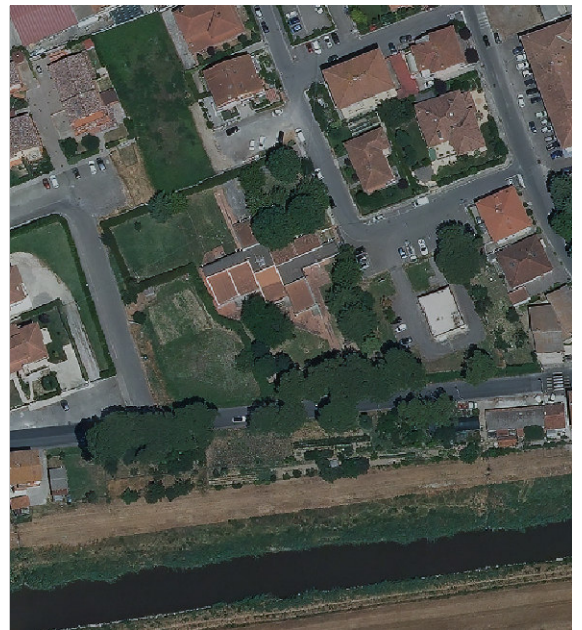

SERIE:

ELABORATI SICUREZZA

ELABORATO:

All.A - Gantt

CODICE:

21_18_FDE
ES_03

SCALA:

-

RESPONSABILE PROGETTAZIONE

Ing. Roberto Pinelli
Via Lungomonte n°218/a
Santa Maria a Monte (PI), 56020
Tel. 3397905993
Email. robertopinelli.ingenium@gmail.com
Pec. roberto.pinelli@ingpec.eu

COLLABORATORI TECNICI

Arch. Martino Falchi

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Ing. Maurizio Iannotta

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
a	PRIMA EMISSIONE	ottobre 2021	Arch. M. Falchi	Ing. R. Pinelli	Ing. M. Iannotta

Nome file: I207_300_21_18_FDE_DG_EG_a_Elaborati grafici

ALLEGATO "A"

Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Adeguamento spazi e aule della scuola dell'infanzia di Montecalvoli

COMMITTENTE: Comune di Santa Maria a Monte.

CANTIERE: Via Anna Frank, Santa Maria a Monte (Pisa)

Santa Maria a Monte, 18/10/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Pinelli Roberto)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Iannotta Maurizio)

Ingegnere Pinelli Roberto

Via Lungomonte, 218/a
56020 Santa Maria a Monte (PI)
Tel.: 3397905993 - Fax: 0
E-Mail: robertopinelli.ingenium@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	02/11/2021	02/11/2021
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	03/11/2021	03/11/2021
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	03/11/2021	03/11/2021
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	04/11/2021	04/11/2021
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	04/11/2021	04/11/2021
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	05/11/2021	05/11/2021
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	31/12/2021	31/12/2021
Parete mobile interna						
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere	1	E	1	1	05/11/2021	05/11/2021
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	1	1	06/11/2021	06/11/2021
Realizzazione di pareti divisorie interne in legno	1	E	2	2	03/12/2021	04/12/2021
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	E	2	2	10/12/2021	11/12/2021
Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili	1	E	1	1	17/12/2021	17/12/2021
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	06/11/2021	06/11/2021
	1	E	1	1	04/12/2021	04/12/2021
	1	E	1	1	11/12/2021	11/12/2021
	1	E	1	1	18/12/2021	18/12/2021
Parete divisoria interna						
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere	1	E	1	1	05/11/2021	05/11/2021
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	1	E	1	1	06/11/2021	06/11/2021
Cablaggio elettrico	1	E	1	1	12/11/2021	12/11/2021
Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili	1	E	1	1	12/11/2021	12/11/2021
Montaggio di porte interne	1	E	1	1	20/11/2021	20/11/2021
Installazione di corpi illuminanti	1	E	1	1	20/11/2021	20/11/2021
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	06/11/2021	06/11/2021
	1	E	1	1	13/11/2021	13/11/2021
	1	E	1	1	20/11/2021	20/11/2021
Antisfondellamento solaio refettorio						
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere	1	E	1	1	23/12/2021	23/12/2021
Rimozione di impianti elettrici	1	E	1	1	23/12/2021	23/12/2021
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	1	1	24/12/2021	24/12/2021
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio	1	E	1	1	27/12/2021	27/12/2021
Cablaggio elettrico	1	E	1	1	27/12/2021	27/12/2021
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	1	1	28/12/2021	28/12/2021
Rasatura di intonaci interni	1	E	1	1	29/12/2021	29/12/2021
Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili	1	E	1	1	30/12/2021	30/12/2021
Installazione di corpi illuminanti	1	E	1	1	31/12/2021	31/12/2021
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	31/12/2021	31/12/2021
Messa in sicurezza percorsi accesso aule						

Tabella Analitica Gantt

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere	1	E	2	2	02/11/2021	03/11/2021
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro	1	E	1	1	04/11/2021	04/11/2021
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	1	E	2	2	05/11/2021	06/11/2021
Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne	1	E	1	1	08/11/2021	08/11/2021
Trattamento antiossidante di armature esterne	1	E	3	3	09/11/2021	11/11/2021
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti	1	E	5	5	09/11/2021	13/11/2021
	1	E	5	5	15/11/2021	19/11/2021
Ripresa di intonaci esterni	1	E	1	1	20/11/2021	20/11/2021
	1	E	2	2	22/11/2021	23/11/2021
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	5	5	29/11/2021	03/12/2021
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	04/12/2021	04/12/2021
Ripristino coperture						
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	2	2	06/12/2021	07/12/2021
Montaggio di parapetti provvisori	1	E	1	1	07/12/2021	07/12/2021
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere	1	E	1	1	09/12/2021	09/12/2021
Rimozione di scossaline e canali di gronda	1	E	1	1	09/12/2021	09/12/2021
Rimozione di manto di copertura in tegole	1	E	2	2	10/12/2021	11/12/2021
Rimozione di manto impermeabile	1	E	3	3	13/12/2021	15/12/2021
Formazione di massetto per coperture	1	E	3	3	16/12/2021	18/12/2021
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	1	1	18/12/2021	18/12/2021
	1	E	3	3	20/12/2021	22/12/2021
Applicazione di vernice protettiva su copertura	1	E	1	1	23/12/2021	23/12/2021
Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo	1	E	1	1	23/12/2021	23/12/2021
Montaggio di scossaline e canali di gronda	1	E	1	1	24/12/2021	24/12/2021
Posa di manto di copertura in tegole	1	E	3	3	27/12/2021	29/12/2021
Smontaggio di parapetti provvisori	1	E	1	1	29/12/2021	29/12/2021
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	30/12/2021	30/12/2021
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	31/12/2021	31/12/2021

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Edile

2) = Impianti elettrici

3) = Cartongesso

4) = Parete mobile

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

