



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Piazza della Vittoria, 47 - 56020 Santa Maria a Monte (PI)

Tel: 0587 261611 - Fax: 0587 705117


PEC: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it

PROGETTO:

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO STORICO DA DESTINARSI A MUSEO E COLLEGAMENTO CON PERCORSO ACCESSIBILE ALL' AREA ARCHEOLOGICA DELLA "ROCCA"

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

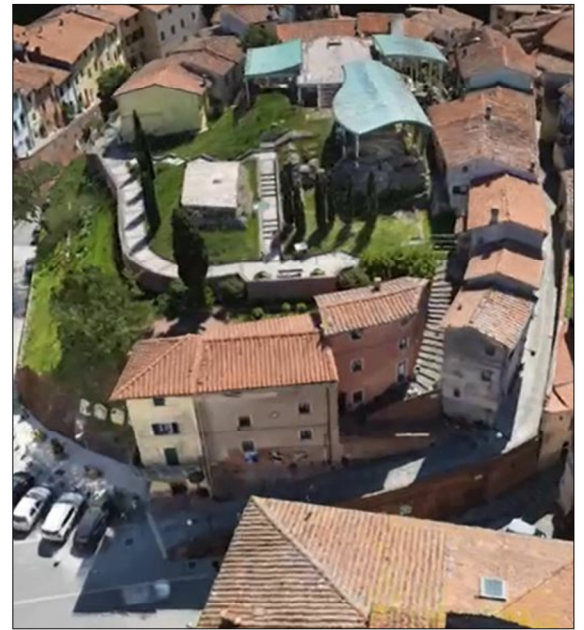

SERIE:

ELABORATI SICUREZZA

ELABORATO:

PSC - All. A - DIAGRAMMA DI GANTT

CODICE:

ES_PS_02

SCALA:

-

RESPONSABILE PROGETTAZIONE

Ing. Roberto Pinelli
Via Lungomonte n°218/a
Santa Maria a Monte (PI), 56020
Tel. 3397905993
Email. robertopinelli.ingenium@gmail.com
Pec. roberto.pinelli@ingpec.eu

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Arch. Martino Falchi
Via di Santa Lucia Nord n°29
Pontedera (PI), 56025
Tel. 3402278108
Email. martino.falchi@gmail.com
Pec. martino.falchi@archiworldpec.it

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Ing. Maurizio Iannotta

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
a	PRIMA EMISSIONE	agosto 2021	Arch. M. Falchi	Ing. R. Pinelli	Ing. M. Iannotta
b	EMISSIONE BANDO CITTA' MURATE	agosto 2022	Arch. M. Falchi	Ing. R. Pinelli	Ing. M. Iannotta

Nome file: Lotto II_0000_E_b_mascherine

ALLEGATO "A"

Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di PISA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO STORICO DA DESTINARSI A MUSEO E COLLEGAMENTO CON PERCORSO ACCESSIBILE ALL'AREA ARCHEOLOGICA DELLA "ROCCA"

COMMITTENTE: Comune di Santa Maria a Monte.

CANTIERE: Via del Cimitero, 41, Santa Maria a Monte (PISA)

Santa Maria a Monte, 30/08/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Pinelli Roberto)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Iannotta Maurizio)

Ingegnere Pinelli Roberto

Via Lungomonte, 218/a

56020 Santa Maria a Monte (PI)

Tel.: 3397905993 - Fax: 0

E-Mail: robertopinelli.ingenium@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Preparazione delle aree di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	02/01/2023	04/01/2023
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	4	4	02/01/2023	05/01/2023
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	4	4	02/01/2023	05/01/2023
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	4	4	02/01/2023	05/01/2023
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	2	2	05/01/2023	06/01/2023
	1	E	5	5	09/01/2023	13/01/2023
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	3	3	04/01/2023	06/01/2023
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	3	3	04/01/2023	06/01/2023
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	3	3	04/01/2023	06/01/2023
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	3	3	04/01/2023	06/01/2023
Demolizioni						
Rimozione di serramenti esterni	1	E	2	2	12/01/2023	13/01/2023
Rimozione di serramenti interni	1	E	2	2	12/01/2023	13/01/2023
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro	1	E	5	5	16/01/2023	20/01/2023
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro	1	E	5	5	16/01/2023	20/01/2023
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano	1	E	2	2	12/01/2023	13/01/2023
	1	E	5	5	16/01/2023	20/01/2023
Rimozione di pavimento in ceramica	1	E	2	2	12/01/2023	13/01/2023
Rimozione di massetto	1	E	5	5	16/01/2023	20/01/2023
Risanamento murature						
Intervento di scuci e cucì						
Scarnitura di vecchie malte ammalorate	1	E	2	2	26/01/2023	27/01/2023
	1	E	5	5	30/01/2023	03/02/2023
Scuci e cucì	1	E	2	2	26/01/2023	27/01/2023
	1	E	5	5	30/01/2023	03/02/2023
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura	1	E	2	2	26/01/2023	27/01/2023
	1	E	5	5	30/01/2023	03/02/2023
Cerchiature e archtravi in acciaio						
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano	1	E	5	5	23/01/2023	27/01/2023
Montaggio di architravi e cerchiature in acciaio	1	E	5	5	23/01/2023	27/01/2023
Realizzazione di murature in elevazione	1	E	5	5	23/01/2023	27/01/2023
Vespai piano terra						
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	1	1	06/02/2023	06/02/2023
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica	1	E	1	1	07/02/2023	07/02/2023

Tabella Analitica Gantt

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	1	E	2	2	08/02/2023	09/02/2023
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	1	E	1	1	10/02/2023	10/02/2023
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	2	2	13/02/2023	14/02/2023
Assistenze murarie per rifacimento impianti						
Scavo eseguito a mano	1	E	3	3	23/01/2023	25/01/2023
Scavo eseguito con martello demolitore	1	E	3	3	23/01/2023	25/01/2023
Esecuzione di tracce eseguite a mano	1	E	3	3	25/01/2023	27/01/2023
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	1	E	3	3	25/01/2023	27/01/2023
Impianto antincendio						
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	1	E	3	3	01/03/2023	03/03/2023
Impianto di condizionamento						
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	1	E	3	3	27/02/2023	01/03/2023
Posa della macchina di condizionamento	1	E	5	5	10/04/2023	14/04/2023
Impianto elettrico e rete dati						
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	3	3	01/03/2023	03/03/2023
Realizzazione di impianto di messa a terra	1	E	3	3	01/03/2023	03/03/2023
Realizzazione di impianto di rete dati	1	E	3	3	01/03/2023	03/03/2023
	1	E	3	3	19/04/2023	21/04/2023
Realizzazione di impianto telefonico	1	E	3	3	01/03/2023	03/03/2023
	1	E	3	3	19/04/2023	21/04/2023
Realizzazione di impianto antintrusione	1	E	3	3	01/03/2023	03/03/2023
	1	E	3	3	19/04/2023	21/04/2023
Cablaggio elettrico	1	E	4	4	17/04/2023	20/04/2023
Installazione di corpi illuminanti	1	E	2	2	20/04/2023	21/04/2023
Passerella esterna						
Scavo eseguito a mano	1	E	5	5	30/01/2023	03/02/2023
Scavo eseguito con martello demolitore	1	E	4	4	06/02/2023	09/02/2023
Protezione delle pareti di scavo	1	E	3	3	08/02/2023	10/02/2023
Drenaggio del terreno di scavo	1	E	3	3	08/02/2023	10/02/2023
Perforazioni per micropali	1	E	5	5	13/02/2023	17/02/2023
Realizzazione di micropali in acciaio	1	E	5	5	13/02/2023	17/02/2023
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	2	2	20/02/2023	21/02/2023
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	2	2	22/02/2023	23/02/2023
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	2	2	23/02/2023	24/02/2023
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	E	2	2	27/04/2023	28/04/2023
	1	E	4	4	01/05/2023	04/05/2023
Posa di ringhiere e parapetti	1	E	1	1	05/05/2023	05/05/2023
	1	E	2	2	08/05/2023	09/05/2023
Montaggio di tavolame in legno	1	E	3	3	10/05/2023	12/05/2023
Rifacimento intonaco e pitturazioni interne						
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	3	3	06/03/2023	08/03/2023
Ripresa di intonaci interni	1	E	2	2	09/03/2023	10/03/2023
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	1	E	2	2	16/03/2023	17/03/2023
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	5	5	03/04/2023	07/04/2023

Tabella Analitica Gantt

Installazione di infissi						
Montaggio di serramenti esterni	1	E	2	2	27/03/2023	28/03/2023
Sostituzione pavimenti e rivestimenti interni						
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali	1	E	1	1	13/03/2023	13/03/2023
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	2	2	14/03/2023	15/03/2023
Formazione di lisciatura per pavimenti interni	1	E	2	2	20/03/2023	21/03/2023
Posa di pavimenti per interni in ceramica	1	E	3	3	29/03/2023	31/03/2023
Rifacimento intonaco e pitturazioni esterne						
Pulitura di intonaci esterni	1	E	1	1	20/03/2023	20/03/2023
Formazione intonaci esterni tradizionali	1	E	3	3	21/03/2023	23/03/2023
Ripresa di intonaci esterni	1	E	2	2	23/03/2023	24/03/2023
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	3	3	05/04/2023	07/04/2023
Opere a verde						
Rinterro di scavo eseguito a mano	1	E	3	3	03/05/2023	05/05/2023
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	3	3	03/05/2023	05/05/2023
Formazione di tappeto erboso	1	E	2	2	08/05/2023	09/05/2023
Prove e collaudi						
Prove impianti termici	1	E	5	5	15/05/2023	19/05/2023
Prove impianti elettrici	1	E	5	5	15/05/2023	19/05/2023
Verifiche e ripristini	1	E	3	3	17/05/2023	19/05/2023
Smobilizzo del cantiere						
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	2	2	10/04/2023	11/04/2023
Smobilizzo del cantiere	1	E	5	5	22/05/2023	26/05/2023
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	5	5	22/05/2023	26/05/2023

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Edile

2) = Opere strutturali in acciaio

3) = Impianti termici

4) = Impianti elettrici

5) = Lavoratori autonomi

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

